

mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2351360

SHCP
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

MST

Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos
Ciclo: 2025 - Período: Primer Trimestre (ENE-MAR)

jesusmelizaldev

Registros de Avances Individual de ProyectosPropósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

\$

Observaciones: Capturista

+ Agregar

Observaciones: Revisión

Categoría del registro

Acción

Adquisición

Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre

Construcción de 3 aulas en segundo nivel Facultad de Arquitectura Culiacán

Tipo de Programa o Proyecto

Proyecto de Inversión de Infraestructura Social

Clasificación del registro

Educación

Subclasificación del registro

Sin identificar

Período de ejecución

03/06/2024 - 31/12/2024

Número de Registro

Número del Proyecto

Estado Responsable

Sinaloa

Municipio Responsable

Gobierno de la Entidad

Institución Ejecutora

Universidad Autónoma de Sinaloa

Población Beneficiada

¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?

Si

No

Mujeres

1336

Hombres

1106

Metas

Periodo de ejecución

📅

03/06/2024 - 31/12/2024

Número de Registro

Número del Proyecto

Mujeres

👤

1336

Hombres

👤

1106

Metas

+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	X Eliminar
Metros Cuadrados	265.0	265.0	Editar	X Eliminar


Geolocalización

Tipo de Georreferencia

Punto(s) Independiente(s)

+ Agregar georreferencia

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Blvd. de las Americas s/n Ciudad Universitaria. C.P. 80013	24.82634000/-107.37996000	X Eliminar

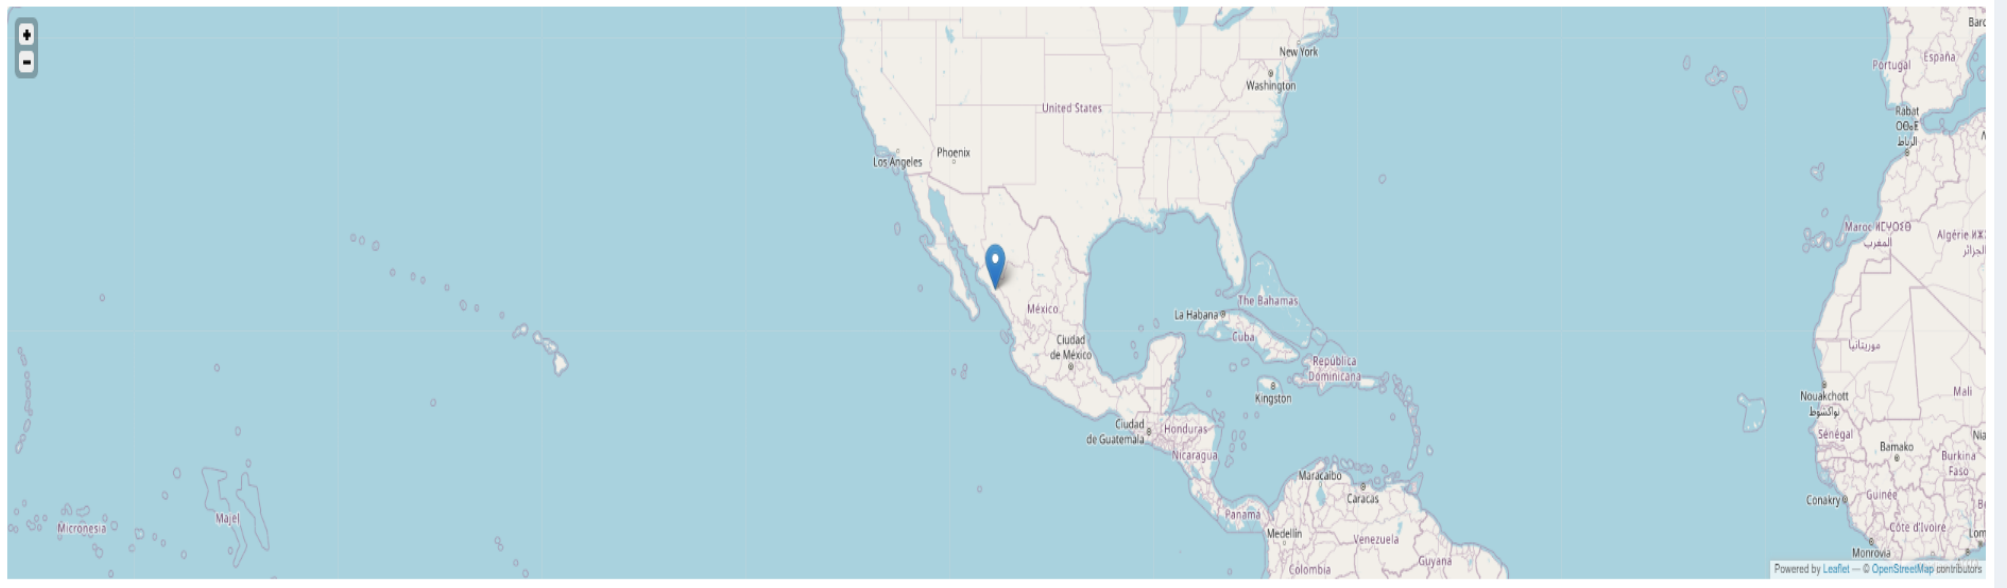

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$10,354,244.00

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal / Componente FAIS	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2024	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$10,354,244.00	\$10,354,244.00	✖ Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2024 / OCT-DIC	\$10,354,244.00	\$10,354,244.00	\$10,354,244.00	\$3,406,430.28	\$3,406,430.28	32.90%	✓ Confirmado
2025 / ENE-MAR	\$10,354,244.00	\$10,354,244.00	\$10,354,244.00	\$10,354,244.00	\$10,354,244.00	100%	✎ Editar
2024 / JUL-SEP	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado
2024 / ABR-JUN	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado
2024 / ENE-MAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 100.00 %

Unidad de Medida

Metros Cuadrados

Meta

265

Meta Modificada

265

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 100.00%

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2025 ENE-MAR	265	100%	✎ Editar
2024 OCT-DIC	23.85	9.00%	✓ Confirmado
2024 JUL-SEP	0	0.00%	✓ Confirmado
2024 ABR-JUN	0	0.00%	✓ Confirmado
2024 ENE-MAR	0	0.00%	✓ Confirmado

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



🗨 Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

🗨 Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

🔍 Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
No se han registrado información de obra.							

🗨 Observaciones: **Revisión**

📎 Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Eliminar



Eliminar

Desarrollo



Eliminar



Eliminar

Termino



Eliminar



Eliminar

✕ Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Aceptar



Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
SIN240102351360

✕ Cancelar

← Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión >

Solicita Cancelación >
