



Coordinación General de Planeación y Desarrollo
Campus Rafael Buelna
Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros 2358
Desarrollo Urbano Tres Ríos
C.P. 80020 Culiacán, Sinaloa, México.
Tel. +52 (667) 759 38 73
Correo: planeacion@uas.edu.mx

UASCGPD/20240131-406

Asunto: Entrega informe FAM 2023 NMS 4to trimestre 2023

Arq. Hugo Echave Meneses

Director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa
Secretaría de Educación Pública y Cultura
Gobierno del estado de Sinaloa

P r e s e n t e.-

Aprovecho este conducto para enviarle un respetuoso saludo y de igual manera me dirijo a Usted en atención a los compromisos institucionales referentes al informe del ejercicio de los recursos recibidos del **Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio fiscal 2023.**

En seguimiento con lo anterior, **la Universidad Autónoma de Sinaloa le informa los avances físicos y financieros** de los programas de **Educación Media Superior** desarrollados con recursos provenientes del Ramo Presupuestario 33 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio fiscal 2023, **correspondientes al 4to trimestre del 2023 (octubre-diciembre), los cuales han sido enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT) del cual se anexa el acuse e informe correspondiente.**

Sin otro particular, agradezco de antemano sus finas atenciones, me reitero como siempre a sus apreciables órdenes y quedo a su disposición para cualquier aclaración.

Atentamente

“Sursum Versus”

Culiacán de Rosales, Sinaloa a 31 de enero de 2024.

Dra. Nancy Guadalupe Domínguez Lizárraga
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE SINALOA
COORDINACIÓN GENERAL DE
PLANEACIÓN Y DESARROLLO

AÑO	FONDO	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	SOSTENIMIENTO	TIPO EDUCATIVO	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN Y META POR REALIZAR	CONSTRUCCIÓN		MANTENIMIENTO		REHABILITACIÓN		MOBILIARIO Y/O EQUIPO		MONTO TOTAL	FECHA DE INICIO	FECHA DE CONCLUSIÓN	AVANCE FÍSICO (%)	AVANCE FINANCIERO (%)	MONTO EJERCIDO (\$)	NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS	PROBLEMÁTICA ATENDIDA	FECHA DE VERIFICACIÓN	SERIALIZACIÓN	ACTA ENTREGA	OBSERVACIONES
											TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO	TIPO DE ESPACIO	MONTO ASIGNADO												
2023	FAM Regular	25UBH0090V	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria Augusto César Sandino	Federal	Media Superior	Sinaloa	Cullacán	Cullacán	Construcción de Módulo Estructura L3C (3EE en planta baja baja, 9 EE primer nivel)	Aula	\$ 8,000,000.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,000,000.00	05/oct/23	25/mar/24	40%	64%	\$ 4,738,526.51	1,841	La insuficiencia de espacios disponibles para atender la demanda de educación de nivel medio superior de calidad en este sector de la ciudad se solventará con esta obra, y permitirá que un mayor número de jóvenes estudiantes puedan cursar su bachillerato en esta unidad académica		SI	No	Obra en proceso		
2023	FAM Regular	25UBH0007F	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria Salvador Allende	Federal	Media Superior	Sinaloa	Cullacán	Cullacán	Construcción de Plaza	Otros	\$ 3,105,693.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,105,693.00	05/oct/23	19/mar/24	41%	58%	\$ 1,741,808.72	3,200	La comunidad estudiantil y personal laboral de esta Unidad académica no cuenta con las áreas suficientes para cumplir con una formación integral del estudiantado, careciendo de los espacios para el fomento a las actividades culturales, cívicas, sociales y de extensión de la Universidad Autónoma de Sinaloa, esta obra permitirá contar con las condiciones suficientes para desarrollar las actividades básicas con las que los jóvenes estudiantes de nivel bachillerato fortalezcan su formación y sean ciudadanos con valores que se desenvuelven en armonía		SI	No	Obra en proceso		

ELABORÓ



MC. MARION SOTO CASTILLO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO

REVISÓ

Ma. Carolina Cota C.

MC. MARÍA CAROLINA COTA CORRALES
COORDINADORA GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

AUTORIZÓ



ING. REFUGIO ISRAEL CHOICO LÓPEZ
DIRECTOR DE CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO



FONDO	ENTIDAD FEDERATIVA	CCT	SUBSISTEMA	NOMBRE DEL PLANTEL	META A REALIZAR	REPORTE FOTOGRÁFICO DE AVANCE FÍSICO				REPORTE FOTOGRÁFICO DE SEÑALIZACIÓN	
						IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN	IMAGEN	DESCRIPCIÓN
FAM Regular	Sinaloa	25UBH0090V	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria Augusto César Sandino	Construcción de Módulo Estructura U3C (3EE planta baja. 9 EE primer nivel).		Colado de losa		Área de trabajo		Lona de señalización
FAM Regular	Sinaloa	25UBH0007F	Universidades Autónomas Estatales (UAE)	Unidad Académica Preparatoria Salvador Allende	Construcción de Plaza		Zapata corrida		Área de trabajo		Lona de señalización

REPORTE RFT FAM (PREPA SANDINO) 4TO TRIM 2023

Browser address bar: mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/observaciones.do?proposito=2270050#

Page Header: SHCP, Ministerio de Hacienda y Crédito Público, MST, Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos, Ciclo: 2023 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC), jesusmelizaldev

Atender Observaciones

Propósito del Gasto: Inicio > Atender Observaciones

Observaciones: **Capturista**

avances

15/01/2024 3:13:57 PM

SE SOLICITA MODIFICAR LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA, EN EL REGISTRO ORIGINAL SE PLASMÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, EN LOS CONTRATOS SIGNADOS, SE ACORDÓ ESTABLECER LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA PARA EL DÍA 25 DE MARZO DE 2024.

Eliminar

Agregar

Observaciones: **Revisión**

15/01/2024 04:02:08 PM

SE REGRESA A PETICIÓN DEL USUARIO CAPTURISTA

Categoría del registro

Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre	Construcción de primer nivel de módulo para aulas de la preparatoria Augusto César Sandino	Estado Responsable	Sinaloa
Tipo de Programa o Proyecto	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio Responsable	Gobierno de la Entidad
Clasificación del registro	Educación	Institución Ejecutora	Universidad Autónoma de Sinaloa
Subclasificación del registro	Sin Identificar	Población Beneficiada	¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No
Período de ejecución	04/10/2023 - 31/12/2023	Mujeres	880
Número de Registro	Número del Proyecto	Hombres	739

Metas

Metas

+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros Cuadrados	433.95	433.95	Editar	Eliminar


Geolocalización

Tipo de Georeferencia

Punto(s) Independiente(s)

Agregar georeferencia

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Constituyente Andrés Magallón sin número colonia Libertad, C.P. 80180	24.77591000/-107.41235000	Eliminar



Cancelar

Guardar y Continuar

Atender Observaciones Propósito del Gasto

Inicio > Atender Observaciones



Observaciones: Capturista

+ Agregar

Observaciones: Revisión

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$8,000,000.00

+ Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	✖ Eliminar

Avance Financiero

+ Registrar Avance

Periodo	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2023 / OCT-DIC	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$8,000,000.00	\$4,738,526.51	\$4,738,526.51	59.23%	✎ Editar
2023 / JUL-SEP	\$3,372,625.00	\$3,372,625.00	\$3,372,625.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **40.00 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros Cuadrados	433.95	433.95

Porcentaje Total de la Meta **40.00 %**

Periodo	Avance	Porcentaje	Acción
2023 OCT-DIC	173.58	40.00%	✎ Editar
2023 JUL-SEP	0	0.00%	✓ Confirmado

Atender Observaciones Propósito del Gasto

Inicio - Atender Observaciones



Observaciones: Capturista

Agregar

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
No se han registrado información de obra.							

Cancelar Anterior

Guardar y Continuar

Atender Observaciones Propósito del Gasto

Inicio > Atender Observaciones



Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

ⓘ Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Eliminar

Desarrollo



Eliminar



Eliminar

✖ Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →

Atender Observaciones Propósito del Gasto

Inicio > Atender Observaciones



¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.

 FOLIO DEL REGISTRO
SIN230302270050

✕ Cancelar

← Anterior

Solicitar Validación >

Solicita Suspensión >

⚠️ Solicita Cancelación >

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

⌵

Aceptar


Atender Observaciones Propósito del Gasto

Inicio > Atender Observaciones



¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.

 FOLIO DEL REGISTRO
SIN230302270050

✕ Cancelar ← Anterior

⌵ Procesando...

Solicita Suspensión >

⚠ Solicita Cancelación >

ACUSE DE CAPTURA RFT (FAM PREPA ALLENDE) 4TO TRIM 2023

Browser address bar: mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2270060

Page Title: **Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos**

Sub-headers: SHCP, SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO, MST, Ciclo: 2023 - Período: Cuarto Trimestre (OCT-DIC)

User: **jesusmelizalde**

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **Capturista**

jesusmelizalde - Capturista 15/01/2024 12:23:38 PM
SE SOLICITA MODIFICAR LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA, DERIVADO DE QUE EN LOS CONTRATOS SIGNADOS, SE ACORDÓ ESTABLECER LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA PARA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2024.

Eliminar + Agregar

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

Acción Adquisición Proyecto de inversión

Detalles del registro

Nombre Construcción de plaza cívica en Preparatoria Dr. Salvador Allende	Estado Responsable Sinaloa
Tipo de Programa o Proyecto Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Municipio Responsable Gobierno de la Entidad
Clasificación del registro Educación	Institución Ejecutora Universidad Autónoma de Sinaloa
Subclasificación del registro Sin identificar	Población Beneficiada ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO
Período de ejecución 04/10/2023 - 31/12/2023	Mujeres 1628
Número de Registro Número del Proyecto	Hombres 1397

Metas

+ Agregar

Unidad de Medida || Meta || Meta Modificada || Editar || Eliminar

numero de registro

Número del Proyecto

Hombres

1397

Metas

+ Agregar

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada	Editar	Eliminar
Metros Cuadrados	531.41	531.41	Editar	Eliminar


Geolocalización

Tipo de Georreferencia

Punto(s) Independiente(s)

Agregar georreferencia

Estado	Municipio	Localidad	Dirección	Latitud / Longitud	Eliminar
Sinaloa	Culiacán	Culiacán Rosales	Calle Rio Sinaloa sin número Colonia Guadalupe. C.P. 80220	24.79307000/-107.38653000	Eliminar

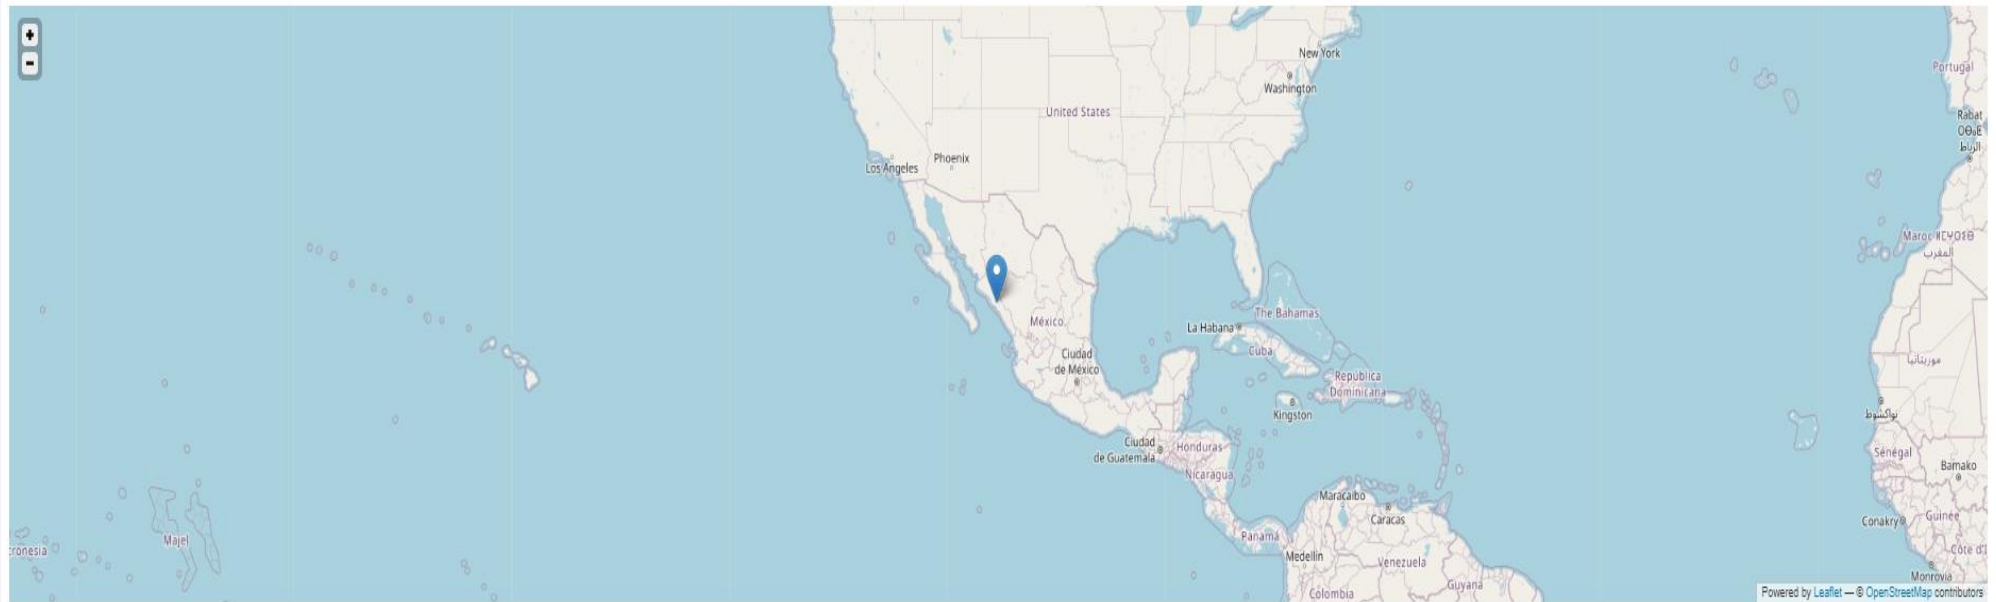

Cancelar

Siguiente

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

Actualización: Capurista
SE AGREGAN AL MODIFICADO RECURSOS POR UN MONTO DE \$291,652.86 CORRESPONDIENTES A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBTENIDOS, LOS CUALES YA FUERON COMPROMETIDOS A TRAVÉS DE LA FIRMA DE CONTRATOS CON LAS EMPRESAS QUE CONSTRUYEN LA OBRA.

15/01/2024 12:28:40 PM

Eliminar

Agregar

Observaciones: **Revisión**

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$3,105,693.00

Agregar Fuente de Financiamiento

Tipo de Recurso	Ciclo de Recurso	Ramo	Programa Presupuestario	Programa Estatal o Municipal	Aprobado	Modificado	Acción
FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2023	33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	1 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior		\$3,105,693.00	\$3,397,345.86	Eliminar

Avance Financiero

Registrar Avance

Período	Recaudado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Avance	Acción
2023 / OCT-DIC	\$3,397,345.86	\$3,397,345.86	\$3,397,345.86	\$1,741,808.72	\$1,741,808.72	\$1.26967%	Editar
2023 / JUL-SEP	\$3,105,693.00	\$3,105,693.00	\$3,105,693.00	\$0.00	\$0.00	0%	✓ Confirmado

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **41.00 %**

Unidad de Medida	Meta	Meta Modificada
Metros Cuadrados	531.41	531.41

Porcentaje Total de la Meta: **41.00%**

Período	Avance	Porcentaje	Acción
2023 OCT-DIC	217.88	41%	Editar
2023 JUL-SEP	0	0.00%	✓ Confirmado

Cancelar Anterior

Guardar y Continuar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

🔍 Buscar por Folio

Tipo de contratación	Número	Contratista	Convocante	Monto	Monto modificado	Ver detalles	Eliminar
No se han registrado información de obra.							

✖ Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: Capturista

+ Agregar

Observaciones: Revisión

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio



Eliminar

Desarrollo



Eliminar



Eliminar

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO
SIN230302270060

✖ Cancelar

← Anterior

Solicitar Validación >

Solicita Suspensión >

🚫 Solicita Cancelación >

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Aceptar



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO
SIN230302270060

Cancelar Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión

Solicita Cancelación
