



Coordinación General de Planeación y Desarrollo  
Campus Rafael Buelna  
Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros 2358  
Desarrollo Urbano Tres Ríos  
C.P. 80020 Culiacán, Sinaloa, México.  
Tel. +52 (667) 759 38 73  
Correo: planeacion@uas.edu.mx

UASCGPD/20240131-405

Asunto: Entrega informe FAM 2023 NS 4to trimestre 2023

**Arq. Hugo Echave Meneses**

Director del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa

Secretaría de Educación Pública y Cultura

Gobierno del estado de Sinaloa

**Presente.-**

Aprovecho este conducto para enviarle un respetuoso saludo y de igual manera me dirijo a Usted en atención a los compromisos institucionales referentes al informe del ejercicio de los recursos recibidos del **Programa Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio fiscal 2023.**

En seguimiento con lo anterior, **la Universidad Autónoma de Sinaloa le informa los avances físicos y financieros** de los programas de **Educación Superior** desarrollados con recursos provenientes del Ramo Presupuestario 33 del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), ejercicio fiscal 2023, **correspondientes al 4to trimestre del 2023 (octubre-diciembre), los cuales han sido enviados a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, mediante el Sistema de Recursos Federales Transferidos (SRFT)** del cual se anexa el acuse e informe correspondiente.

Sin otro particular, agradezco de antemano sus finas atenciones, me reitero como siempre a sus apreciables órdenes y quedo a su disposición para cualquier aclaración.

Atentamente

“Sursum Versus”

Culiacán de Rosales, Sinaloa a 31 de enero de 2024

Dra. Nancy Guadalupe Domínguez Lizárraga  
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo





2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

**FAM**  
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Octubre - Diciembre 2023

Fecha de elaboración: 31/12/2023

REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: Universidad Autónoma de Sinaloa

Entidad federativa: Sinaloa

Clave 911: 25MSU0013B

Planeación

RESPONSABLES

Obras y Mantenimiento

Nombre: MC María Carolina Cota Corrales  
Cargo: Coordinadora General de Planeación y Desarrollo  
Teléfono: 667 759 3873  
Correo electrónico: planeacion@uas.edu.mx

Nombre: Arq. Refugio Israel Cholico López  
Cargo: Director de Construcción y Mantenimiento  
Teléfono: 66 72 08 99 32  
Correo electrónico: dcdireccion@uas.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

| Prioridad<br>ID de acuerdo con el SIFAM | Nombre del proyecto   | Tipo de proyecto          |                      |              |                      |               | Monto autorizado (A) | CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA |                         |                    |                 |   | Monto ejercido (D) | Remanente (E) =B-D | Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado) |   |                           | Acciones que sustentan el avance | % de avance     | Fechas Reales |                  | Observaciones | Reintegro a la TESOFE |         |                  | Actas         |         |   |       |   |       |  |  |  |  |  |
|---|---|---------------------------|----------------------|--------------|----------------------|---------------|----------------------|---|-------------------------|--------------------|-----------------|---|--------------------|--------------------|---|---|---------------------------|----------------------------------|-----------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------|---------|------------------|---------------|---------|---|-------|---|-------|--|--|--|--|--|
|   |   | Obra nueva (construcción) | Obra de restauración | Equipamiento | Adquisición e mejora | Mantenimiento |                      | Proyecto sustentable                          | No. (s) de Contrato (s) | Fechas Programadas |                 | Monto Contratado (B)                            |                    |                    | Contratista   | Monto no Contratado(C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B     | Nombre del Espacio/equipo |                                  |                 | Cantidad      | Metros Cuadrados |               | Inicio                | Término | Línea de Captura | Fecha de pago | Importe | Entrega- Recepción (Acta finiquito) MONTO | Fecha | Acta Administrativa de Entrega- Recepción (formato DGESU) MONTO | Fecha |  |  |  |  |  |
|   |   |                           |                      |              |                      |               |                      |   |                         | INICIO             | TÉRMINO         |   |                    |                    |   |   |                           |                                  |                 |               |                  |               |                       |         |                  |               |         |   |       |   |       |  |  |  |  |  |
| 1                                       | Unidad Académica Facultad de Ciencias del Mar. Construcción de Módulo 13 entre ejes, 3 niveles; para laboratorio y aulas (segunda etapa). | X                         |                      |              |                      |               | \$12,698,332.00      | UAS-DCM-FAM-LP-2023-002                       | 26/10/2023              | 20/03/2024         | \$12,508,049.60 | Ingeniería de Negocios Sostenibles S.A. de C.V. | \$190,282.40       | \$ 4,792,962.86    | \$ 7,715,086.74                                       | Aulas   | 7                         | 537.00                           | Obra en proceso | 65%           | 26/10/23         | 20/03/24      |                       |         |                  |               |         |   |       |   |       |  |  |  |  |  |
| 2                                       | Facultad de Psicología, Mazatlan. Construcción de Módulo 01, segundo nivel, 6 aulas.  | X                         |                      |              |                      |               | \$6,349,166.00       | UAS-DCM-FAM-LP-2023-001                       | 05/10/2023              | 15/03/2024         | \$ 6,260,677.21 | A de C. Construcciones S.A. de C.V.             | \$88,488.79        | \$ 4,025,481.11    | \$ 2,235,196.10                                       | Aulas   | 8                         | 555.00                           | Obra en proceso | 50%           | 05/10/23         | 15/03/24      |                       |         |                  |               |         |   |       |   |       |  |  |  |  |  |
| 4                                       | Facultad de Ciencias del Mar. Mantenimiento de módulo 2.  |                           |                      | X            |                      |               | \$4,819,810.00       | UAS-DCM-FAM-LP-2023-003                       | 26/10/2023              | 29/03/2024         | \$ 4,434,430.17 | Luis Jaen Zazueta Jacobo                        | \$385,379.83       | \$ 2,773,524.94    | \$ 1,860,905.23                                       | 1 Auditorio/ 7 laboratorios/ 6 Aulas/ 2 Centros de Computo / 1 Biblioteca | 17                        | 1800.00                          | Obra en proceso | 30%           | 26/10/23         | 29/03/24      |                       |         |                  |               |         |   |       |   |       |  |  |  |  |  |
|   |   |                           |                      |              |                      |               | \$23,867,308.00      |   |                         |                    |                 |   | \$875,662.23       | \$7,666,487.80     | \$9,375,991.97  |   |                           |                                  |                 |               |                  |               |                       |         |                  |               |         |   |       |   |       |  |  |  |  |  |

ARG. REFUGIO ISRAEL CHOLICO LÓPEZ  
Director de Construcción y Mantenimiento

MC. MARÍA CAROLINA COTA CORRALES  
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo



2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
Octubre - Diciembre 2023

Fecha de elaboración: 31/12/2023


REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PROGRESO 1 Nombre de la obra: Unidad Académica Facultad de Ciencias del Mar. Construcción de Módulo 13 entre ejes, 3 niveles; para laboratorio y aulas (segunda etapa).

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

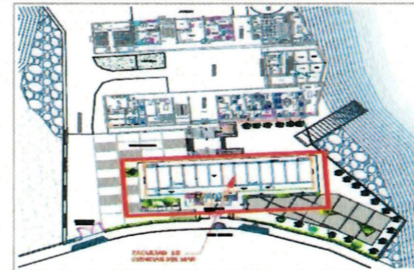

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS




Dirección Postal: Facultad Ciencias del Mar, Paseo Clausen S/N, Colonia Los Pinos, Mazatlán, Sinaloa, México. C.P. 80000



Porcentaje de avance

65%

FOTOS

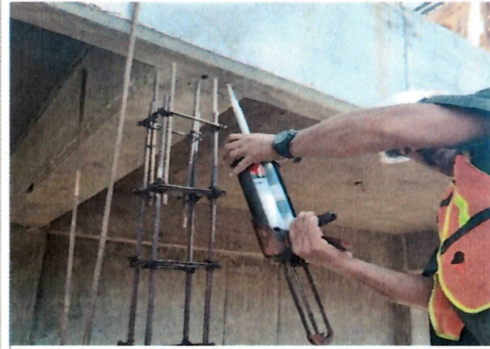

1.- ANCLAJE QUÍMICO



2.- ARMADO DE ESCALERA



3.- DESIMBRADO DE LOSA



4.- ACOLADO DE MUROS LOSA

Observaciones :

- 1.- ANCLAJE QUÍMICO
- 2.- ARMADO DE ESCALERA
- 3.- DESIMBRADO DE LOSA
- 4.- COLIDADO DE LOSA

*[Handwritten signature]*

M. Felipe Israel Chelito López  
Director de Construcción y Mantenimiento

*[Handwritten signature]*

M.C. María Carolina Cota Corrales  
Coordinadora General de Manejo y Desarrollo



2023

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:

Octubre - Diciembre 2023

Fecha de elaboración: 31/12/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

PRIMORDIAL 2 Nombre de la obra: Facultad de Psicología Mazatlan, continuación de modulo 01, segundo nivel, 6 aulas.



Porcentaje de avance

50%

GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS



Malaquias y Avenida Eje 2A, Fracc. Pradera Dorada, Mazatlan, Sinaloa. Código Postal 82139, México.

FOTOS



1.-IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA



2.- PULIDO DE INTERIORES



3.-COLADO DE LOSA



4.- PULIDO DE VIGAS

Observaciones :

- 1.- IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA
- 2.- PULIDO DE INTERIORES
- 3.- COLADO DE LOSA
- 4.- PULIDO DE VIGAS

ARQ. REFUGIO ISRAEL CHOLICO LÓPEZ  
Director de Construcción y Mantenimiento

M.C. Carolina Cota C  
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo



2023

EJERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:  
**Octubre - Diciembre 2023**

Fecha de elaboración: 31/12/2023

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL



Porcentaje de avance


**30%**

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: **Unidad Académica Facultad de Ciencias del Mar, Mantenimiento de modulo 2.**


GEOREFERENCIA O CROQUIS DE LOCALIZACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO



CROQUIS REFERENCIADO EN PLANTA DE CONJUNTO DE LA OBRA O PROYECTO

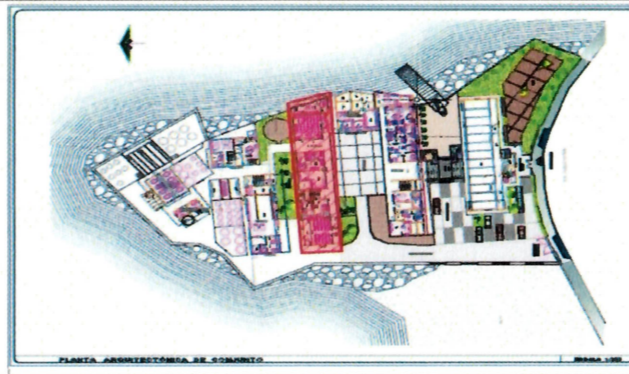

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO CON FOTOS REFERENCIADAS

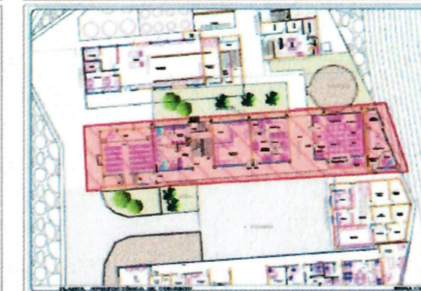

Dirección Postal: Facultad Ciencias del Mar, Paseo Clausen S/N, Colonia Los Pinos, Mazatlan, Sinaloa; México. C.P. 80000

FOTOS



1.-IMPERMEABILIZACIÓN



2.-PINTURA EN FACHADA



3.-AULA REMODELADA



4.- INSTALACIÓN DE CANCELERÍA

Observaciones :

- 1. IMPERMEABILIZACIÓN
- 2.-PINTURA EN FACHADA
- 3.-AULA REMODELADA
- 4.- INSTALACIÓN DE CANCELERÍA

Arg. Refugio Israel Chólico López  
Director de Construcción y Mantenimiento

M.a. Carolina Gota C  
MC. María Carolina Gota Corrales  
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo



# ACUSE DE CAPTURA FAM (FACIMAR 2DA ETAPA) 4TO TRIM 2023

## Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto



### Observaciones: Capturista

**jesusmelizalde - Capturista**  
SE SOLICITA MODIFICAR LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA, DERIVADO DE QUE EN LOS CONTRATOS SIGNADOS, SE ACORDÓ ESTABLECER LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA PARA EL DÍA 20 DE MARZO DE 2024.  
15/01/2024 2:00:35 PM  
[Eliminar](#)  
[Agregar](#)

### Observaciones: Revisión

Categoría del registro

Acción  Adquisición  Proyecto de inversión

**Detalles del registro**

|   |  |
|---|--|
| <b>Nombre</b><br>Construcción de Aulas y Laboratorios FACIMAR (2da etapa)             | <b>Estado Responsable</b><br>Sinaloa   |
| <b>Tipo de Programa o Proyecto</b><br>Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | <b>Municipio Responsable</b><br>Gobierno de la Entidad   |
| <b>Clasificación del registro</b><br>Educación  | <b>Institución Ejecutora</b><br>Universidad Autónoma de Sinaloa  |
| <b>Subclasificación del registro</b><br>Sin identificar                               | <b>Población Beneficiada</b><br>¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO |
| <b>Periodo de ejecución</b><br>01/07/2023 - 31/12/2023                                | <b>Mujeres</b><br>231  |
| <b>Número de Registro</b><br>Número del Proyecto                                      | <b>Hombres</b><br>396  |

### Metas

|                         |      |                 |        |          |
|-------------------------|------|-----------------|--------|----------|
| <a href="#">Agregar</a> |      |                 |        |          |
| Unidad de Medida        | Meta | Meta Modificada | Editar | Eliminar |



numero de registro

Número del Proyecto

Hombres

396

Metas

+ Agregar

| Unidad de Medida | Meta  | Meta Modificada | Editar | Eliminar |
|------------------|-------|-----------------|--------|----------|
| Metros Cuadrados | 537.0 | 537.0           | Editar | Eliminar |


Geolocalización

Tipo de Georreferencia

Punto(s) Independiente(s)

Agregar georreferencia

| Estado  | Municipio | Localidad | Dirección                             | Latitud / Longitud        | Eliminar |
|---------|-----------|-----------|---------------------------------------|---------------------------|----------|
| Sinaloa | Mazatlán  | Mazatlán  | Paseo Claussen sin número. C.P. 82000 | 23.20832000/-106.42655000 | Eliminar |



Cancelar

Siguiente



Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$12,698,332.00

+ Agregar Fuente de Financiamiento

| Tipo de Recurso                                 | Ciclo de Recurso | Ramo  | Programa Presupuestario                                       | Programa Estatal o Municipal | Aprobado        | Modificado      | Acción     |
|---|------------------|---|---|------------------------------|-----------------|-----------------|------------|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023             | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                              | \$12,698,332.00 | \$12,698,332.00 | ✖ Eliminar |

Avance Financiero

+ Registrar Avance

| Periodo        | Recaudado       | Comprometido    | Devengado       | Ejercido       | Pagado         | Avance     | Acción       |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|------------|--------------|
| 2023 / OCT-DIC | \$12,698,332.00 | \$12,698,332.00 | \$12,698,332.00 | \$4,792,962.86 | \$4,792,962.86 | 37.748239% | ✎ Editar     |
| 2023 / JUL-SEP | \$2,753,618.00  | \$2,753,618.00  | \$2,753,618.00  | \$0.00         | \$0.00         | 0%         | ✓ Confirmado |
| 2023 / ABR-JUN | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0%         | ✓ Confirmado |
| 2023 / ENE-MAR | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00          | \$0.00         | \$0.00         | 0%         | ✓ Confirmado |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos **65.00%**

Unidad de Medida

Metros Cuadrados

Meta

537

Meta Modificada

537

+ Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta **65.00%**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción       |
|--------------|--------|------------|--------------|
| 2023 OCT-DIC | 349.05 | 65%        | ✎ Editar     |
| 2023 JUL-SEP | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado |
| 2023 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado |
| 2023 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado |

✖ Cancelar ← Anterior

Guardar y Continuar →



Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: Capturista

Agregar

Observaciones: Revisión

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

| Tipo de contratación                      | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|---|--------|-------------|------------|-------|------------------|--------------|----------|
| No se han registrado información de obra. |        |             |            |       |                  |              |          |

Cancelar Anterior

Guardar y Continuar



Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

ⓘ Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio

Clic para seleccionar

(o Arrastra los archivos aquí)

Desarrollo



Eliminar



Eliminar



Eliminar

✖ Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →



## Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



### ¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.



FOLIO DEL REGISTRO  
**SIN230102212987**

✖ Cancelar   ← Anterior

Solicitar Validación >

Solicita Suspensión >

🚫 Solicita Cancelación >



Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Aceptar



¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
**SIN230102212987**

✖ Cancelar   ← Anterior



⌛ Procesando...

Solicita Suspensión >

🔄 Solicita Cancelación >

# REPORTE RFT FAM (PSICOLOGÍA MZT) 4TO TRIM 2023

← → ↻ mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/observaciones.do?proposito=2212989#

SHCP   Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos  
Ciclo: 2023 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC) jesumelizaldev

Atender Observaciones Inicio -> Atender Observaciones

**Observaciones: Capturista**

avances

¡ jesumelizaldev - Capturista 15/01/2024 3:20:21 PM

SE SOLICITA MODIFICAR LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA, EN EL REGISTRO ORIGINAL SE PLASMO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, EN LOS CONTRATOS SIGNADOS, SE ACORDÓ ESTABLECER LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA PARA EL DÍA 15 DE MARZO DE 2024. ✖ Eliminar

+ Agregar

**Observaciones: Revisión**

¡ jesumelizaldev - Revisión pendiente 15/01/2024 04:03:11 PM

SE REGRESA A PETICIÓN DEL USUARIO CAPTURISTA

**Categoría del registro**

Acción  Adquisición  Proyecto de inversión

**Detalles del registro**

|   |  |
|---|--|
| <b>Nombre</b><br>CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS FACULTAD DE PSICOLOGÍA MAZATLÁN UAS          | <b>Estado Responsable</b><br>Sinaloa   |
| <b>Tipo de Programa o Proyecto</b><br>Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | <b>Municipio Responsable</b><br>Gobierno de la Entidad   |
| <b>Clasificación del registro</b><br>Educación  | <b>Institución Ejecutora</b><br>Universidad Autónoma de Sinaloa  |
| <b>Subclasificación del registro</b><br>Sin identificar                               | <b>Población Beneficiada</b><br>¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input checked="" type="checkbox"/> Sí <input type="checkbox"/> No |
| <b>Periodo de ejecución</b><br>01/06/2023 - 31/12/2023                                | <b>Mujeres</b><br>269  |
| <b>Número de Registro</b><br>Número del Proyecto                                      | <b>Hombres</b><br>762  |

www.hacienda.gob.mx

29°C Soleado ESP LAA 03:20 p. m. 15/01/2024



### Metas

+ Agregar

| Unidad de Medida | Meta  | Meta Modificada | Editar                 | Eliminar                 |
|------------------|-------|-----------------|------------------------|--------------------------|
| Metros Cuadrados | 555.0 | 555.0           | <a href="#">Editar</a> | <a href="#">Eliminar</a> |


### Geolocalización

#### Tipo de Georeferencia

Punto(s) Independiente(s)

Agregar georeferencia

| Estado  | Municipio | Localidad | Dirección                            | Latitud / Longitud        | Eliminar                 |
|---------|-----------|-----------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Sinaloa | Mazatlán  | Mazatlán  | Av. Malaquias sin número. C.P. 82139 | 23.27662000/-106.36976000 | <a href="#">Eliminar</a> |

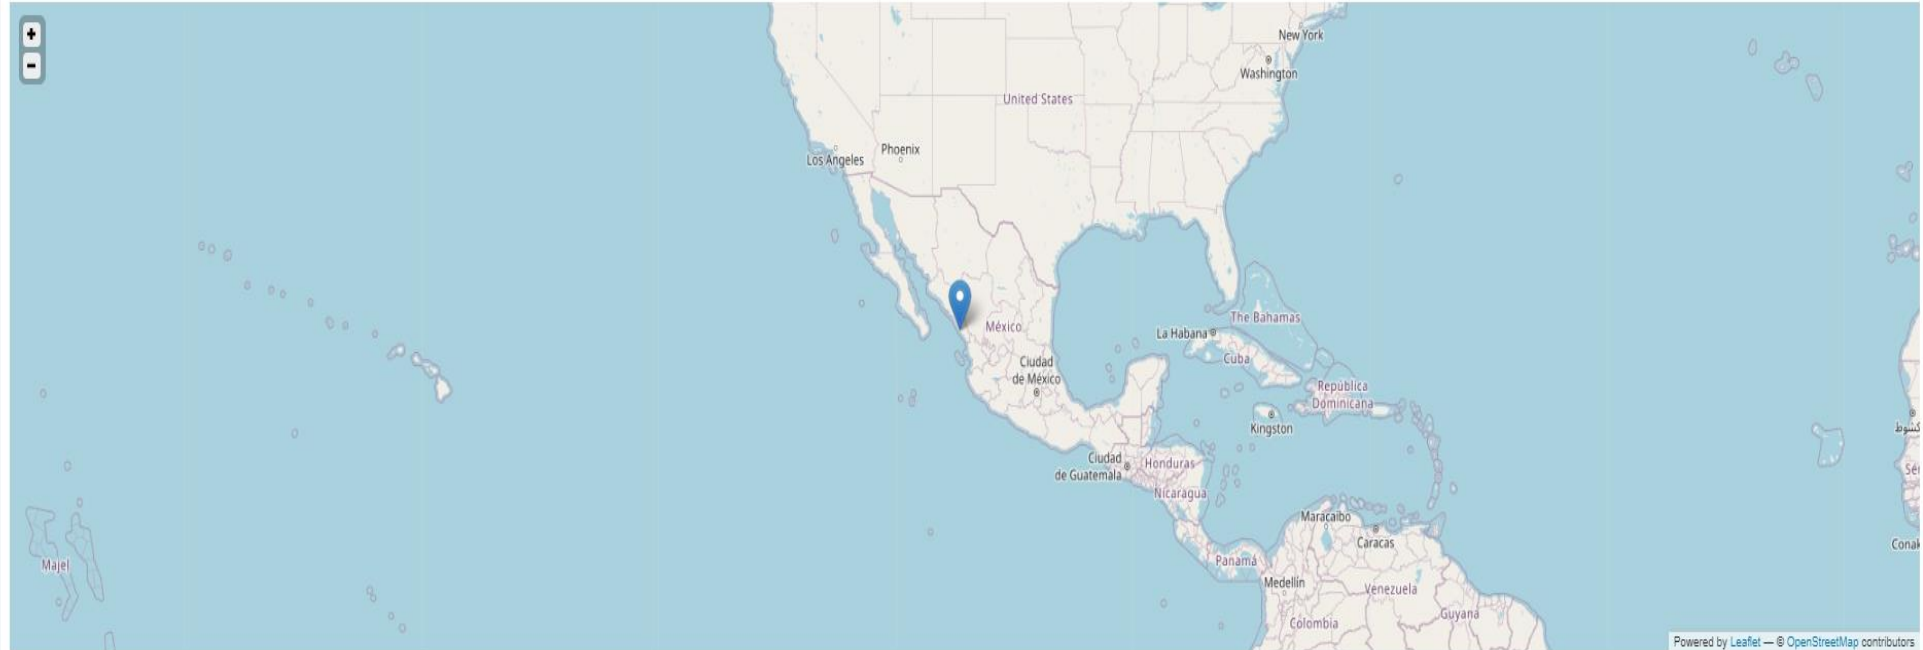

Cancelar

Guardar y Continuar

Observaciones: **capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$6,349,166.00

+ Agregar Fuente de Financiamiento

| Tipo de Recurso                                 | Ciclo de Recurso | Ramo  | Programa Presupuestario                                       | Programa Estatal o Municipal | Aprobado       | Modificado     | Acción                     |
|---|------------------|---|---|------------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023             | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I 008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                              | \$6,349,166.00 | \$6,349,166.00 | <a href="#">✖ Eliminar</a> |

Avance Financiero

Registrar Avance

| Periodo        | Recaudado      | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Avance | Acción                   |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------|--------------------------|
| 2023 / OCT-DIC | \$6,349,166.00 | \$6,349,166.00 | \$6,349,166.00 | \$4,025,481.11 | \$4,025,481.11 | 63.40% | <a href="#">✎ Editar</a> |
| 2023 / JUL-SEP | \$6,349,166.00 | \$6,349,166.00 | \$6,349,166.00 | \$0.00         | \$0.00         | 0%     | ✓ Confirmado             |
| 2023 / ABR-JUN | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | 0%     | ✓ Confirmado             |
| 2023 / ENE-MAR | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | 0%     | ✓ Confirmado             |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos: **50.00 %**

Unidad de Medida

Metros Cuadrados

Meta

555

Meta Modificada

555

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta: **50.00 %**

| Periodo      | Avance | Porcentaje | Acción                   |
|--------------|--------|------------|--------------------------|
| 2023 OCT-DIC | 277.5  | 50.00%     | <a href="#">✎ Editar</a> |
| 2023 JUL-SEP | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado             |
| 2023 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado             |
| 2023 ENE-MAR | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado             |

✖ Cancelar Anterior

Guardary Continuar ➔



Atender Observaciones Propósito del Gasto

Inicio > Atender Observaciones



Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

| Tipo de contratación | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|----------------------|--------|-------------|------------|-------|------------------|--------------|----------|
|----------------------|--------|-------------|------------|-------|------------------|--------------|----------|

No se han registrado información de obra.

✖ Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →

Atender Observaciones Propósito del Gasto

Inicio > Atender Observaciones



Observaciones: Capturista

+ Agregar

Observaciones: Revisión

Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio

Clic para seleccionar

(o Arrastra los archivos aquí)

Desarrollo



Eliminar



Eliminar



Eliminar

Cancelar Anterior

Guardar y Continuar



Atender Observaciones Propósito del Gasto

Inicio > Atender Observaciones



### ¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.

 FOLIO DEL REGISTRO  
**SIN230102212989**

✖ Cancelar   ← Anterior

Solicitar Validación >

Solicita Suspensión >

 Solicita Cancelación >

La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente. ✕

[Aceptar](#)

Atender Observaciones Propósito del Gasto

Inicio > Atender Observaciones



¡Registro Exitoso!

Haz completado satisfactoriamente el registro. Ahora puedes solicitar su validación.

FOLIO DEL REGISTRO  
**SIN230102212989**

[✕ Cancelar](#) [← Anterior](#)

[Procesando...](#)

[Solicita Suspensión >](#)

[Solicita Cancelación >](#)



# REPORTE RFT FAM (FACIMAR MANTENIMIENTO) 4TO TRIM 2023

Browser address bar: [mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2235481](http://mst.hacienda.gob.mx/rft-web/propositoGasto/avances.do?proposito=2235481)

Page Header: SHCP, MST, Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos, Ciclo: 2023 - Periodo: Cuarto Trimestre (OCT-DIC), jesusmelizaldev

### Registros de Avances Individual de Proyectos

Inicio - Registros de Avances Individual de Proyectos

Observaciones: **Capturista**

**¡Incompletado - Capturista**

SE SOLICITA MODIFICAR LA FECHA DE CONCLUSIÓN DE LA OBRA, DERIVADO DE QUE EN LOS CONTRATOS SIGNADOS, SE ACORDÓ ESTABLECER LA FECHA DE TERMINACIÓN DE LA OBRA PARA EL DÍA 29 DE MARZO DE 2024. 15/01/2024 2:17:13 PM

Eliminar Agregar

Observaciones: **Revisión**

Categoría del registro

Acción Adquisición **Proyecto de inversión**

Detalles del registro

|                                      |  |                              |  |
|--------------------------------------|--|------------------------------|--|
| <b>Nombre</b>                        | Mantenimiento General de aulas, laboratorios, biblioteca e instalaciones general del módulo 2 de la Facultad de Ciencias del Mar UAS | <b>Estado Responsable</b>    | Sinaloa  |
| <b>Tipo de Programa o Proyecto</b>   | Programa de Inversión de Mantenimiento   | <b>Municipio Responsable</b> | Gobierno de la Entidad   |
| <b>Clasificación del registro</b>    | Educación  | <b>Institución Ejecutora</b> | Universidad Autónoma de Sinaloa  |
| <b>Subclasificación del registro</b> | Sin identificar  | <b>Población Beneficiada</b> | ¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres? <input type="checkbox"/> Sí <input checked="" type="checkbox"/> No |
| <b>Período de ejecución</b>          | 01/08/2023 - 31/12/2023  | <b>Mujeres</b>               | 231  |
| <b>Número de Registro</b>            | Número del Proyecto  | <b>Hombres</b>               | 396  |

Metas

Agregar

Unidad de Medida Meta Meta Modificada Editar Eliminar

System tray: 29°C Soleado, Búsqueda, Windows taskbar, ESP LAA, 02:17 p. m. 15/01/2024

Clasificación del registro

Educación

Subclasificación del registro

Sin identificar

Período de ejecución

01/08/2023 - 31/12/2023

Número de Registro

Número del Proyecto

Institución Ejecutora

Universidad Autónoma de Sinaloa

Población Beneficiada

¿Es posible identificar población beneficiaria por hombres y mujeres?  Sí  No

Mujeres

231

Hombres

396

Metas

Agregar

| Unidad de Medida | Meta   | Meta Modificada | Editar | Eliminar |
|------------------|--------|-----------------|--------|----------|
| Metros Cuadrados | 1800.0 | 1800.0          | Editar | Eliminar |


Geolocalización

Tipo de Georreferencia

Punto(s) Independiente(s)

Agregar georreferencia

| Estado  | Municipio | Localidad | Dirección  | Latitud / Longitud        | Eliminar |
|---------|-----------|-----------|--|---------------------------|----------|
| Sinaloa | Mazatlán  | Mazatlán  | Paseo Clausen sin número, Colonia Los Pinos, Mazatlán, Sinaloa. C.P. 82000 | 23.20850000 -106.42660000 | Eliminar |



Cancelar

Siguiente



Observaciones: Capturista

Agregar

Observaciones: Revisión

Fuentes de Financiamiento

Monto Global Aprobado

\$4,819,810.00

Agregar Fuente de Financiamiento

| Tipo de Recurso                                 | Ciclo de Recurso | Ramo  | Programa Presupuestario                                      | Programa Estatal o Municipal | Aprobado       | Modificado     | Acción                   |
|---|------------------|---|--|------------------------------|----------------|----------------|--------------------------|
| FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023             | 33 - Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | 1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior |                              | \$4,819,810.00 | \$5,559,304.81 | <a href="#">Eliminar</a> |

Avance Financiero

Registrar Avance

| Período        | Recaudado      | Comprometido   | Devengado      | Ejercido       | Pagado         | Avance    | Acción                 |
|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|------------------------|
| 2023 / OCT-DIC | \$5,559,304.81 | \$5,559,304.81 | \$5,559,304.81 | \$2,773,524.94 | \$2,773,524.94 | 49.88978% | <a href="#">Editar</a> |
| 2023 / JUL-SEP | \$4,819,810.00 | \$4,819,810.00 | \$4,819,810.00 | \$0.00         | \$0.00         | 0%        | ✓ Confirmado           |
| 2023 / ABR-JUN | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | \$0.00         | 0%        | ✓ Confirmado           |

Avances Físicos

Promedio del Porcentaje de Avances Físicos 30.00%

Unidad de Medida

Metros Cuadrados

Meta

1800

Meta Modificada

1800

Registrar Avance

Porcentaje Total de la Meta 30.00%

| Período      | Avance | Porcentaje | Acción                 |
|--------------|--------|------------|------------------------|
| 2023 OCT-DIC | 540    | 30%        | <a href="#">Editar</a> |
| 2023 JUL-SEP | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |
| 2023 ABR-JUN | 0      | 0.00%      | ✓ Confirmado           |

Cancelar

Anterior

Guardar y Continuar





Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: **Capturista**

+ Agregar

Observaciones: **Revisión**

Información de obra por contrato o administración directa

Buscar por Folio

| Tipo de contratación                      | Número | Contratista | Convocante | Monto | Monto modificado | Ver detalles | Eliminar |
|---|--------|-------------|------------|-------|------------------|--------------|----------|
| No se han registrado información de obra. |        |             |            |       |                  |              |          |

✖ Cancelar ← Anterior

Guardar y Continuar →

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio Registros de Avances Individual de Proyectos



Observaciones: Capturista

+ Agregar

Observaciones: Revisión

ⓘ Puede cargar al menos una fotografía, máximo tres por etapa y debe ser de un máximo de 1Mb.

Inicio

Clic para seleccionar

(o Arrastra los archivos aquí)

Desarrollo



Eliminar



Eliminar



Eliminar

✖ Cancelar

← Anterior

Guardar y Continuar →

Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



¡Se han registrado avances!  
Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

FOLIO DEL REGISTRO  
**SIN230202235481**

✕ Cancelar ← Anterior

Solicitar Validación >

Solicita Suspensión >

Solicita Cancelación >



La acción 'Solicitar Validación' se realizó correctamente.

Aceptar

### Registros de Avances Individual de Proyectos Propósito del Gasto

Inicio > Registros de Avances Individual de Proyectos



### ¡Se han registrado avances!

Haz completado satisfactoriamente el registro de los avances.

 FOLIO DEL REGISTRO  
**SIN230202235481**

✕ Cancelar   ← Anterior

Procesando...

Solicita Suspensión >

🔄 Solicita Cancelación >
