



Coordinación General de Planeacion y Desarrollo &lt;planeacion@uas.edu.mx&gt;

## UASinaloa entrega informe FAM 2023 NS 3er Trimestre 2023

2 mensajes

Planeación UAS &lt;planeacion@uas.edu.mx&gt;

6 de octubre de 2023, 20:04

Para: dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx, rocioc@nube.sep.gob.mx, cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx, Claudia Dueñas Ramírez <claudia.duenas@nube.sep.gob.mx>, jcarlosv@nube.sep.gob.mx, Soila Maribel Gaxiola Camacho <soilagaxiola@uas.edu.mx>, eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx  
CC: dcmuas@yahoo.com.mx, roge22@hotmail.com

[UASinaloa informe FAM 2023 NS 3er Trimestre 202...](#)

**Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**  
**Director de Fortalecimiento Institucional de la**  
**Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la**  
**Subsecretaría de Educación Superior**  
**Secretaría de Educación Pública**  
**P r e s e n t e.-**

Aprovecho este conducto para saludarlo e informarle sobre el seguimiento a los avances de las obras comprometidas en el **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** para la **Educación Superior**, correspondiente al **ejercicio fiscal 2023**. En ese sentido, la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta el **Informe** correspondiente al **Tercer Trimestre (julio-septiembre de 2023)**, de las obras apoyadas con recursos del **FAM 2023**.

Sin otro particular, agradezco de antemano sus finas atenciones, me reitero como siempre a sus apreciables órdenes y quedo a su disposición para cualquier aclaración.

**Atentamente**

*“Sursum Versus”*

Culiacán de Rosales, Sinaloa a 05 de octubre de 2023.

Dra. Soila Maribel Gaxiola Camacho

Coordinadora General de Planeación y Desarrollo

Universidad Autónoma de Sinaloa

### 2 archivos adjuntos

**Oficio Oficio FAM 2023 NS septiembre 2023.pdf**  
276K

**UASinaloa informe FAM 2023 NS 3er Trimestre 2023.pdf**  
2534K

**COMUNICADOS DFI** <dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx>  
Para: Planeación UAS <planeacion@uas.edu.mx>

9 de octubre de 2023, 06:18

**Con fundamento en el numeral tercero del “Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos para el intercambio de información oficial a través de correo electrónico institucional como medida complementaria de las acciones para el combate de la enfermedad generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de abril 2020, se acusa de recibida la información enviada a la Dirección de Fortalecimiento Institucional.**

**De:** Planeación UAS <planeacion@uas.edu.mx>

**Enviado:** viernes, 6 de octubre de 2023 09:04 p. m.

**Para:** COMUNICADOS DFI <dfi.dgesui@nube.sep.gob.mx>; María del Rocío Chávez Mayo <rocioc@nube.sep.gob.mx>; Carlos Enrique Sánchez Mendoza <cenrique.sanchez@nube.sep.gob.mx>; Claudia Dueñas Ramírez <claudia.duenas@nube.sep.gob.mx>; Jesus Carlos Villa Leal <jcarlosv@nube.sep.gob.mx>; Soila Maribel Gaxiola Camacho <soilagaxiola@uas.edu.mx>; Eduardo Gerardo Rosas González <eduardo.rosas@nube.sep.gob.mx>

**Cc:** dcmuas@yahoo.com.mx <dcmuas@yahoo.com.mx>; roge22@hotmail.com <roge22@hotmail.com>

**Asunto:** [Externo] UASinaloa entrega informe FAM 2023 NS 3er Trimestre 2023

**Precaución:** Este correo se originó desde fuera de la Institución. No haga clic en enlaces ni abra archivos adjuntos a menos que reconozca al remitente y tenga conocimiento que el contenido es seguro.

[Texto citado oculto]



Coordinación General de Planeación y Desarrollo  
Campus Rafael Buelna  
Blvd. Miguel Tamayo Espinoza de los Monteros 2358  
Desarrollo Urbano Tres Ríos,  
C.P. 80020, Culiacán, Sinaloa, México.  
Tel: +52 (667) 759 38 73  
Correo: planeacion@uas.edu.mx

UASCGPD/2023-1005-139

Asunto: Entrega informe FAM 2023 3er trimestre 2023

**Dr. Eduardo Gerardo Rosas González**  
**Director de Fortalecimiento Institucional de la**  
**Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural de la**  
**Subsecretaría de Educación Superior**  
**Secretaría de Educación Pública**  
**P r e s e n t e.-**

Aprovecho este conducto para saludarlo e informarle sobre el seguimiento a los avances de las obras comprometidas en el **Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM)** para la **Educación Superior**, correspondiente al **ejercicio fiscal 2023**. En ese sentido, la Universidad Autónoma de Sinaloa presenta el **Informe** correspondiente al **Tercer Trimestre (julio-septiembre de 2023)**, de las obras apoyadas con recursos del **FAM 2023**.

Sin otro particular, agradezco de antemano sus finas atenciones, me reitero como siempre a sus apreciables órdenes y quedo a su disposición para cualquier aclaración.

**Atentamente**

*"Sursum Versus"*

Culiacán de Rosales, Sinaloa a 05 de octubre de 2023.

**Dra. Soila Maribel Gaxiola Camacho**

**Coordinadora General de Planeación y Desarrollo**



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  
DE SINALOA  
COORDINACIÓN GENERAL DE  
PLANEACIÓN Y DESARROLLO



2023

AÑO

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

30 de Septiembre de 2023.

FECHA DE CORTE:

**REPORTE DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL**

DATOS DE LA UNIVERSIDAD



Nombre: **Universidad Autónoma de Sinaloa**

Entidad federativa: Sinaloa

Clave Inst 911: 25MSU0013B

RESPONSABLES

Planeación  
Nombre: Dra. Soila Maribel Gaxiola Camacho  
Cargo: Coordinadora General de Planeación y Desarrollo  
Teléfono: 667 1 02 8476, 667 759 3873  
Correo electrónico: soilagaxiola@uas.edu.mx, planeacion@uas.edu.mx

Obras y Mantenimiento  
Nombre: MC. Jorge Pérez Rubio  
Cargo: Director de Construcción y Mantenimiento  
Teléfono: 667 759 7792  
Correo electrónico: uasdcmdireccion@hotmail.com

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

OBRA CONCLUIDA

Prioridad	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto autorizado	Monto ejercido	Remanente	Alcance del proyecto en cuanto a espacios físicos, metros cuadrados y tipo de proyecto			Acciones que sustentan el avance	Acciones por realizar	% de avance	Fechas		Observaciones	¿Es susceptible de ser inaugurada? (Causas)	Si ya fue inaugurada		Cuenta con Actas		
		Otra de continuidad	Equipamiento	Adecuaciones y mejoras	Mantenimiento	Proyecto sustentable				Espacio/equipo	cantidad	metros cuadrados				Inicio	Término			¿Cuenta con fotos del evento?	¿Quién y cuándo inauguró?	Entrega-Recepción (Acta finiquito)	Acta Administrativa de Entrega Recepción	Monto de Acta Administrativa
1	Unidad Académica Facultad de Ciencias del Mar, Construcción de Módulo 13 entre ejes, 3 niveles; para laboratorio y aulas (segunda etapa).	X					\$12,698,332.00	\$0.00	\$12,698,332.00	7 aulas	7	537	EN PROCESO DE LICITACION		0%	25/10/2023	31/12/2023							
2	Facultad de Psicología, Mazatlan. Construcción de Módulo 01, segundo nivel, 6 aulas.	X					\$6,349,166.00	\$0.00	\$6,349,166.00	6 aulas	6	555	OBRA LICITADA	EN PROCESO DE FALLO	0%	04/10/2023	31/12/2023							
4	Facultad de Ciencias del Mar, Mantenimiento de módulo 2.			X			\$4,819,810.00	\$0.00	\$4,819,810.00	1 Auditorio/ 7 laboratorios/ 6 Aulas/ 2 Centros de Computo / 1 Biblioteca	17	1800	EN PROCESO DE LICITACION		0%	25/10/2023	31/12/2023							
						<b>TOTAL</b>					<b>30</b>	<b>2892.80</b>	<b>GLOBAL DEL PROYECTO</b>											
							<b>\$23,867,308.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$23,867,308.00</b>															

*Soila M. Gaxiola C.*  
DRA. SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO  
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo

*Jorge Pérez Rubio*  
MC. JORGE PÉREZ RUBIO  
Director de Construcción y Mantenimiento



2023

AÑO

FAM

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado

30 de Septiembre de 2023

FECHA DE CORTE

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL



Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD 1

Nombre de la obra: **Unidad Académica Facultad de Ciencias del Mar, Construcción de Módulo 13 entre ejes, 3 niveles; para laboratorio y aulas ( Segunda etapa).**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN



UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Paseo Claussen, S/N Pinos. Apartado postal 610.  
Codigo Postal 82000.

FOTOS



1.- COLADO DE LOSA PLANTA BAJA



COLADO DE COLUMNAS DE PRIMER NIVEL

Comentarios de los trabajos realizados:



CIMBRADOS DE MURO DE CONCRETO PRIMER NIVEL



INSTALACIONES ELECTRICAS



CIMBRADO DE COLUMNAS

*Soila M. Gaxiola*  
DRA. SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO  
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo

*Jorge F. Rubio*  
MC. JORGE FÉLIX RUBIO  
Director de Campuses y Mantenimiento



2023

FAM

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA


Mes reportado  
30 de Septiembre de 2023

FECHA DE CORTE:

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL

PRIORIDAD **2** Nombre de la obra: **Facultad de Psicología Mazatlan, continuación de modulo 01, segundo nivel, 6 aulas.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

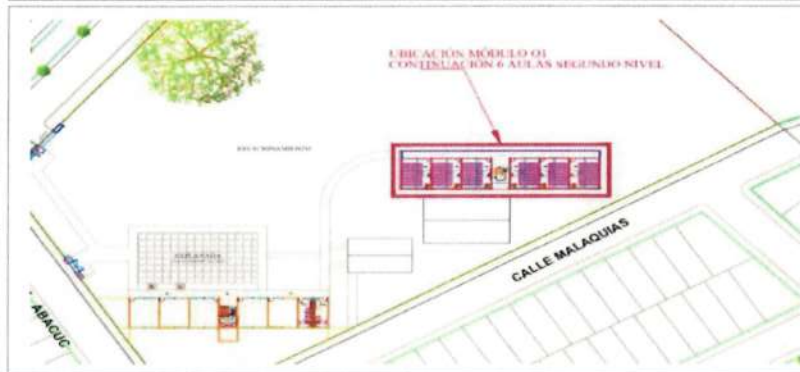

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Malaquias y Avenida Eje 2A, Fracc. Pradera Dorada, Mazatlan, Sinaloa. Código Postal 82139.



Porcentaje de avance

0%

FOTOS

Comentarios de los trabajos realizados:



*Soila Maribel Gaxiola Camacho*  
DRA. SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO  
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo

CIMBRADO  
*Jorge Pérez Rubio*  
MC. JORGE PÉREZ RUBIO  
Director de Constitución y Mantenimiento



2023

**FAM**

FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA  
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL  
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Mes reportado  
30 de Septiembre de 2023

FECHA DE CORTE

REPORTE FOTOGRÁFICO DEL INFORME DE AVANCE MENSUAL




Porcentaje de avance

0%

PRIORIDAD **4** Nombre de la obra: **Unidad Académica Facultad de Ciencias del Mar, Mantenimiento de modulo 2.**

CROQUIS DE LOCALIZACIÓN

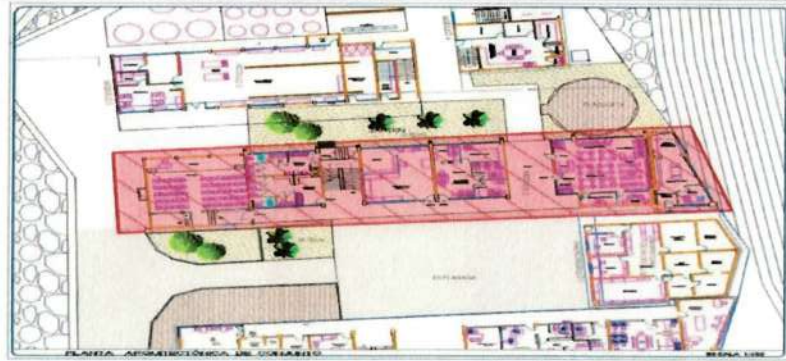

UBICACIÓN DE LA OBRA O PROYECTO

Paseo Claussen, S/N Pinos. Apartado postal 610.  
Codigo Postal 82000.

FOTOS



Fachada frontal



Fachada posterior

Comentarios de los trabajos realizados:



Fachada Posterior



Fachada posterior

*Soila Maribel Gaxiola Camacho*  
DRA. SOILA MARIBEL GAXIOLA CAMACHO  
Coordinadora General de Planeación y Desarrollo

*Jorge Pérez Rubio*  
MC. JORGE PÉREZ RUBIO  
Director de Construcción y Mantenimiento
